

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Obra:
Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO
Endereço:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia

Data:
MAIO/2020

Área (m²):
864,65

Valor Total (R\$):
933.968,05

Custo p/m² (R\$):
1.080,17

Prazo estimado (meses):
4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													933.968,05		1.000,17		4	
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	L.D.I.	V.TOTAL(R\$)	o/L.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias					
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)				
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	17.781,78	2,38%	4.445,71	22.227,49	-	80,0%	17.782,00	20,0%	4.445,50	-	-	-	-				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	EXAUSTÃO	80.285,31	10,75%	20.072,53	100.357,84	-	-	-	-	-	50,0%	50.178,92	50,0%	50.178,92				
4	COBERTURA	70.345,05	9,41%	17.587,32	87.932,37	-	-	-	100,0%	87.932,37	-	-	-	-				
5	REVESTIMENTOS	13.280,00	1,78%	3.320,20	16.600,20	-	-	-	100,0%	16.600,20	-	-	-	-				
6	FORROS E TETOS	21.810,74	2,92%	5.453,01	27.263,76	-	-	-	-	-	100,0%	27.263,76	-	-				
7	PAVIMENTAÇÃO	12.363,46	1,65%	3.091,05	15.454,51	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	15.454,51				
8	PINTURA	14.534,17	1,95%	3.633,76	18.167,93	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	18.167,93				
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.424,06	3,27%	6.106,38	30.530,44	-	-	50,0%	15.265,22	50,0%	15.265,22	-	-	-				
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.506,00	0,34%	626,54	3.132,54	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.132,54				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	87.296,89	11,68%	21.823,03	109.109,92	-	-	50,0%	54.554,96	50,0%	54.554,96	-	-	-				
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	57.348,07	7,68%	14.337,88	71.685,95	-	-	-	-	100,0%	71.685,95	-	-	-				
13	CAIBEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV	21.112,98	2,83%	5.278,56	26.391,54	-	-	-	-	50,0%	13.195,77	50,0%	13.195,77	-				
14	ESQUADRIAS	17.338,15	2,32%	4.334,80	21.672,95	-	-	50,0%	10.836,47	50,0%	10.836,47	-	-	-				
15	CLIMATIZAÇÃO	17.857,08	2,39%	4.464,54	22.321,61	-	-	-	-	-	-	100,0%	22.321,61	-				
16	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.629,53	3,70%	6.907,80	34.537,33	-	-	-	-	-	-	100,0%	34.537,33	-				
17	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	24.643,86	3,30%	6.161,34	30.805,20	-	-	-	-	-	-	100,0%	30.805,20	-				
18	EQUIPAMENTOS	79.900,00	10%	12.784,08	92.684,08	-	-	-	-	-	-	100,0%	92.684,08	-				
	SUBTOTAL I (SERVIÇOS)	590.447,13	78,25%	140.428,53	730.875,66	2,43%	17.782,00	25,95%	189.634,72	33,25%	242.981,05	38,38%	280.477,89					
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	L.D.I.	V.TOTAL(R\$)	o/L.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias					
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	162.471,96	21,75%	40.620,43	203.092,39	2,43%	4.941,18	25,95%	52.694,83	33,25%	67.518,46	38,38%	77.937,92					
	SUBTOTAL II (ADM LOCAL)	162.471,96	21,75%	40.620,43	203.092,39	2,43%	4.941,18	7,21%	52.694,83	9,24%	67.518,46	10,66%	77.937,92					
	TOTAL GERAL	752.919,09	100,00%	181.048,96	933.968,05	2,43%	22.723,18	25,95%	242.329,55	33,25%	310.499,52	38,38%	358.415,81					
	TOTAL ACUMULADO	752.919,09	100,00%	181.048,96	933.968,05	2,43%	22.723,18	28,38%	265.052,72	61,62%	575.552,24	100,00%	933.968,05					


HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Obra:	Data:			
Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO	MAIO/2020			
Endereço:	Área (m2):	Valor Total (R\$):	Custo p/m2 (R\$):	Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia	864,65	933.968,05	1.080,17	4

PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS

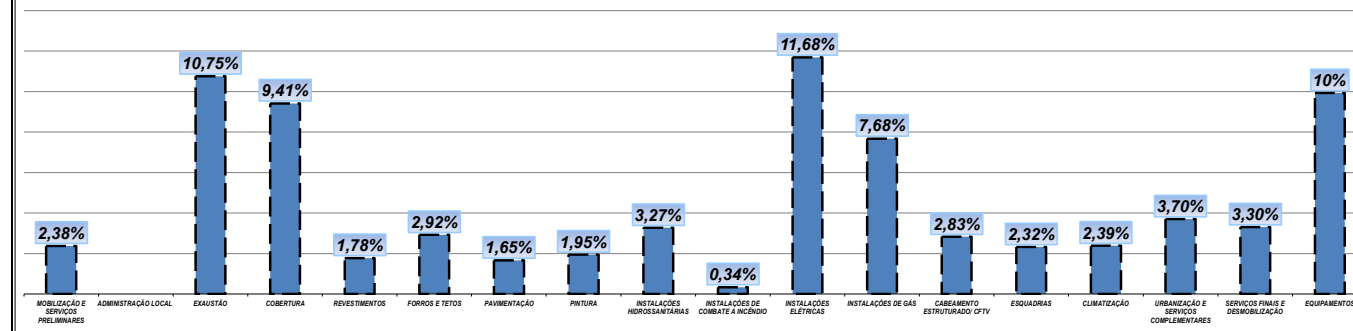

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Obra:	Data:			
Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO	MAIO/2020			
Endereço:	Área (m2):	Valor Total (R\$):	Custo p/m2 (R\$):	Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia	864,65	933.968,05	1.080,17	4

CURVA S

